



Infostar NG

Informationen aus dem FIS

Rodolfo Semprevivo

FIS Fachbereich Infostar, Leiter Fachbereich Infostar


Produkt Verantwortlicher Infostar NG



Inhalt


- **Projektstand und Ausblick**
 - Gesamtüberblick
 - Planung
 - Team/Personalressourcen
 - Stand der Umsetzung
 - Ausblick
- **Migration**
 - Stand / Kennzahlen
 - Problematik
- **Pilot**
- **Schulungen**
- **Ausblick auf Infostar NG 2**
- **Vorbereitungen der Kantone**
- **Einführung des Systems am 11.11.**
- **Demo**
 - Neu umgesetzte Funktionen

Projektstand: Gesamtübersicht

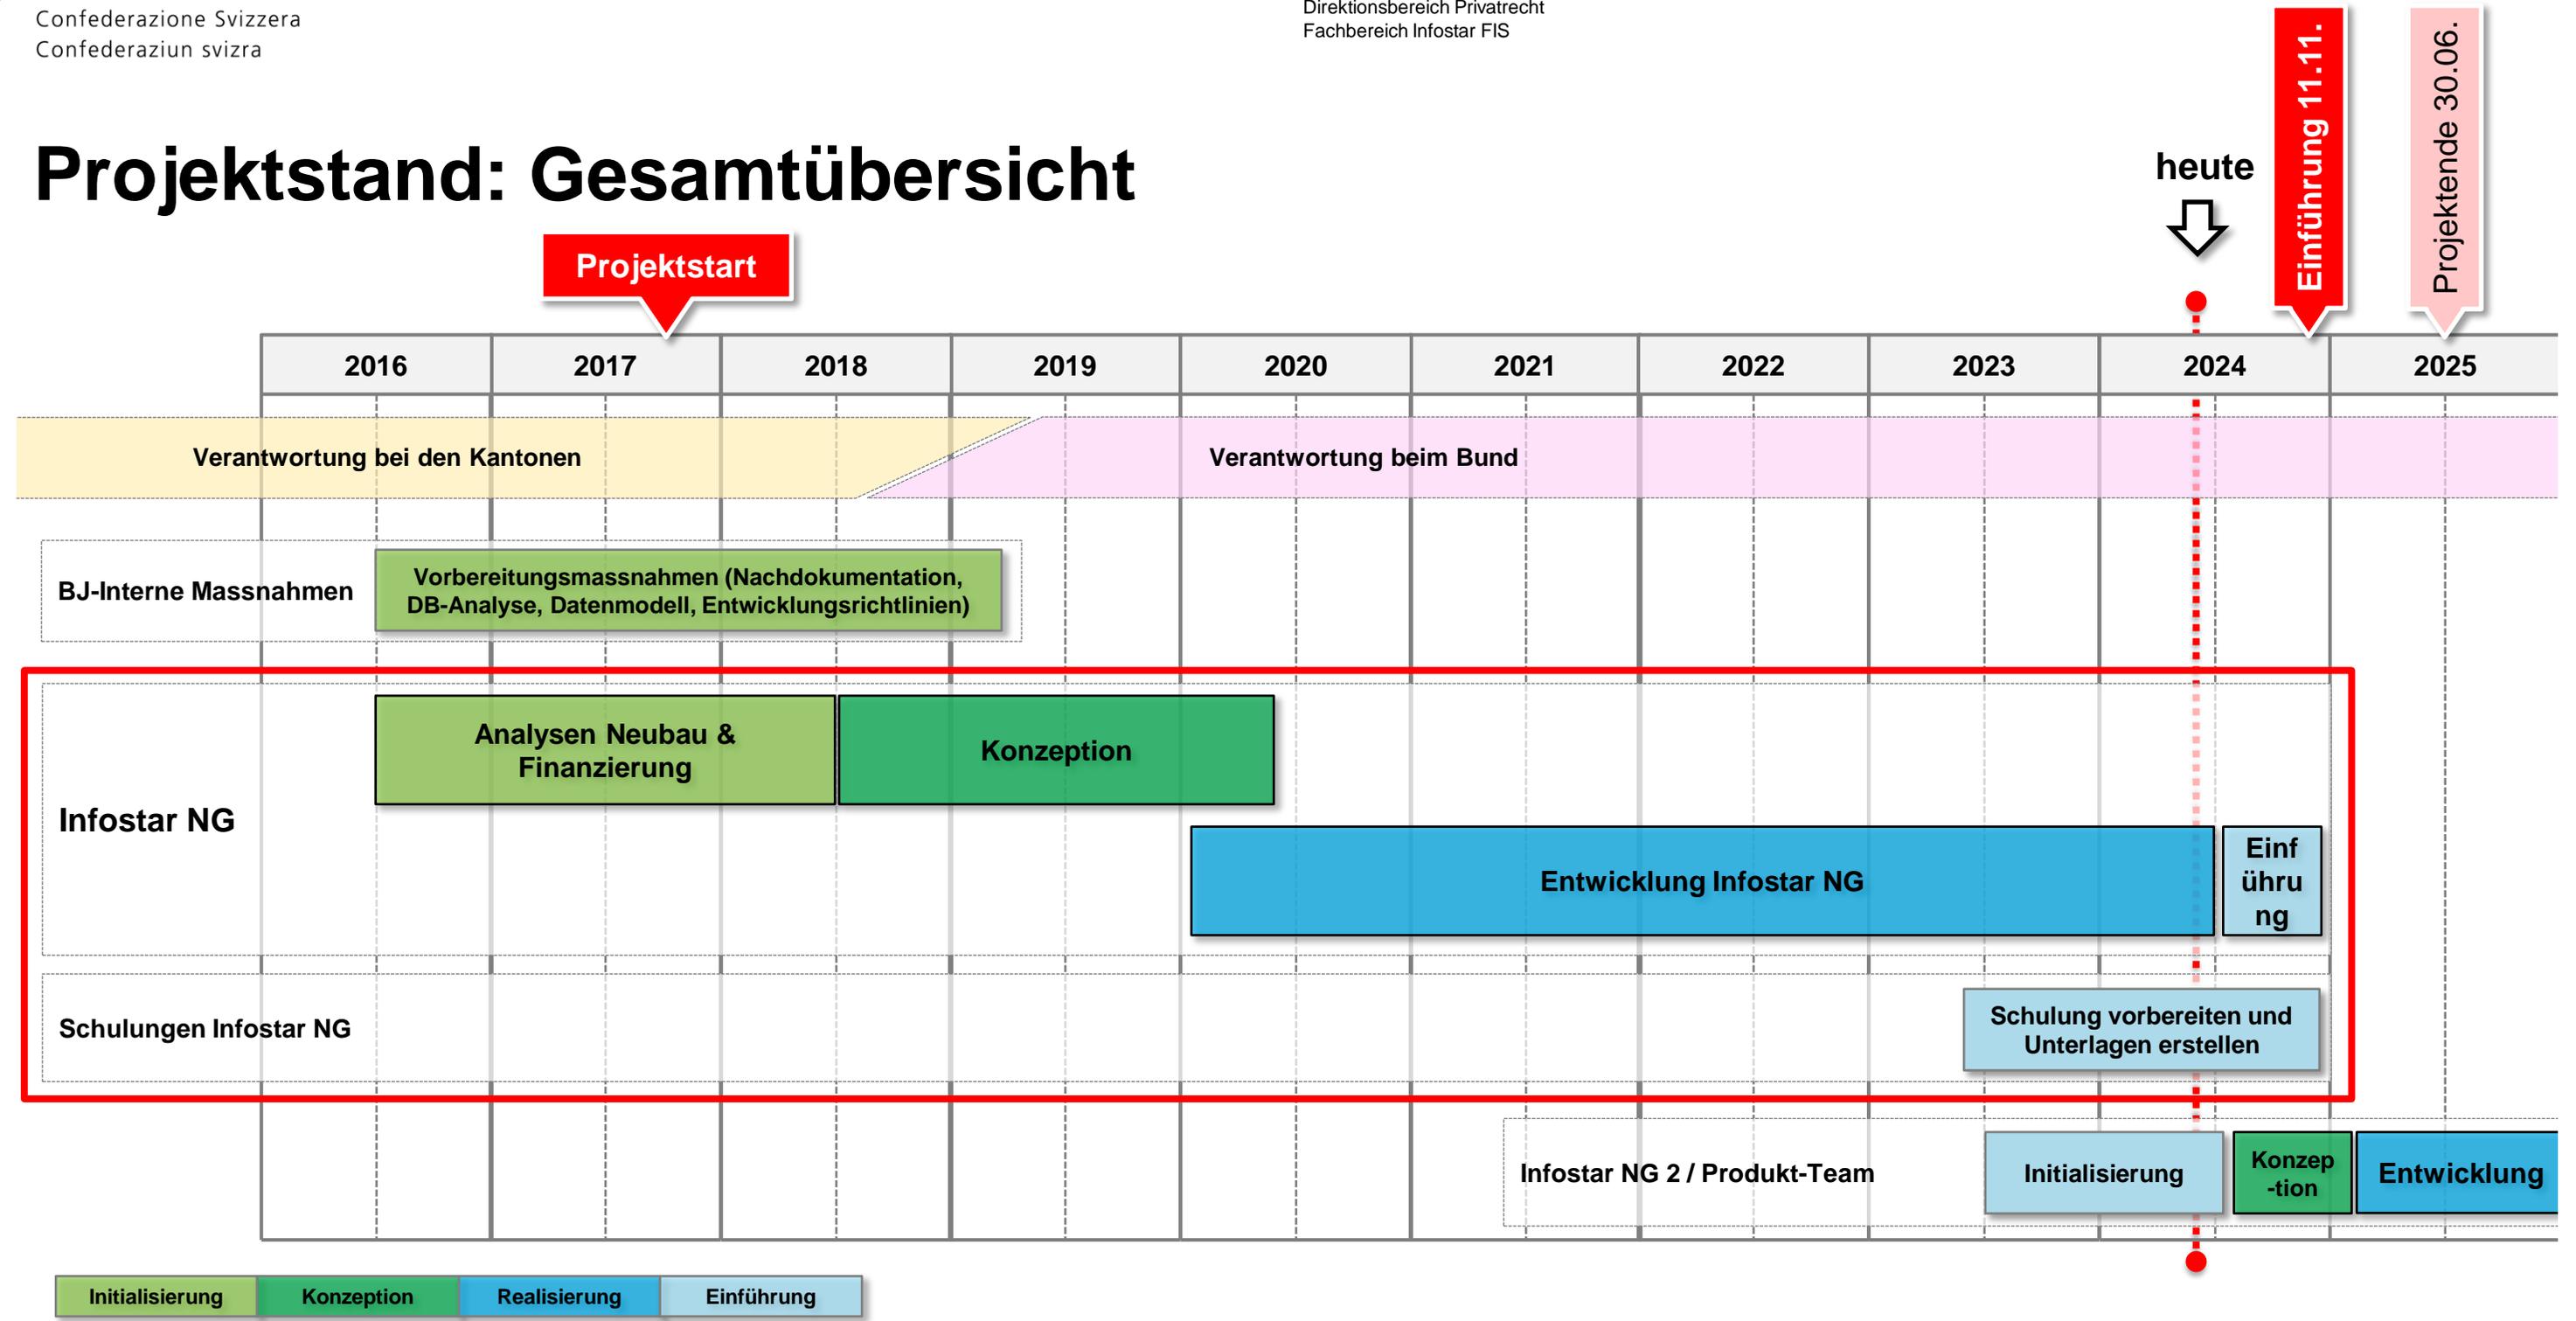


Übersicht – Schulung, Pilot, Produktion

Einführung
11.11.2024

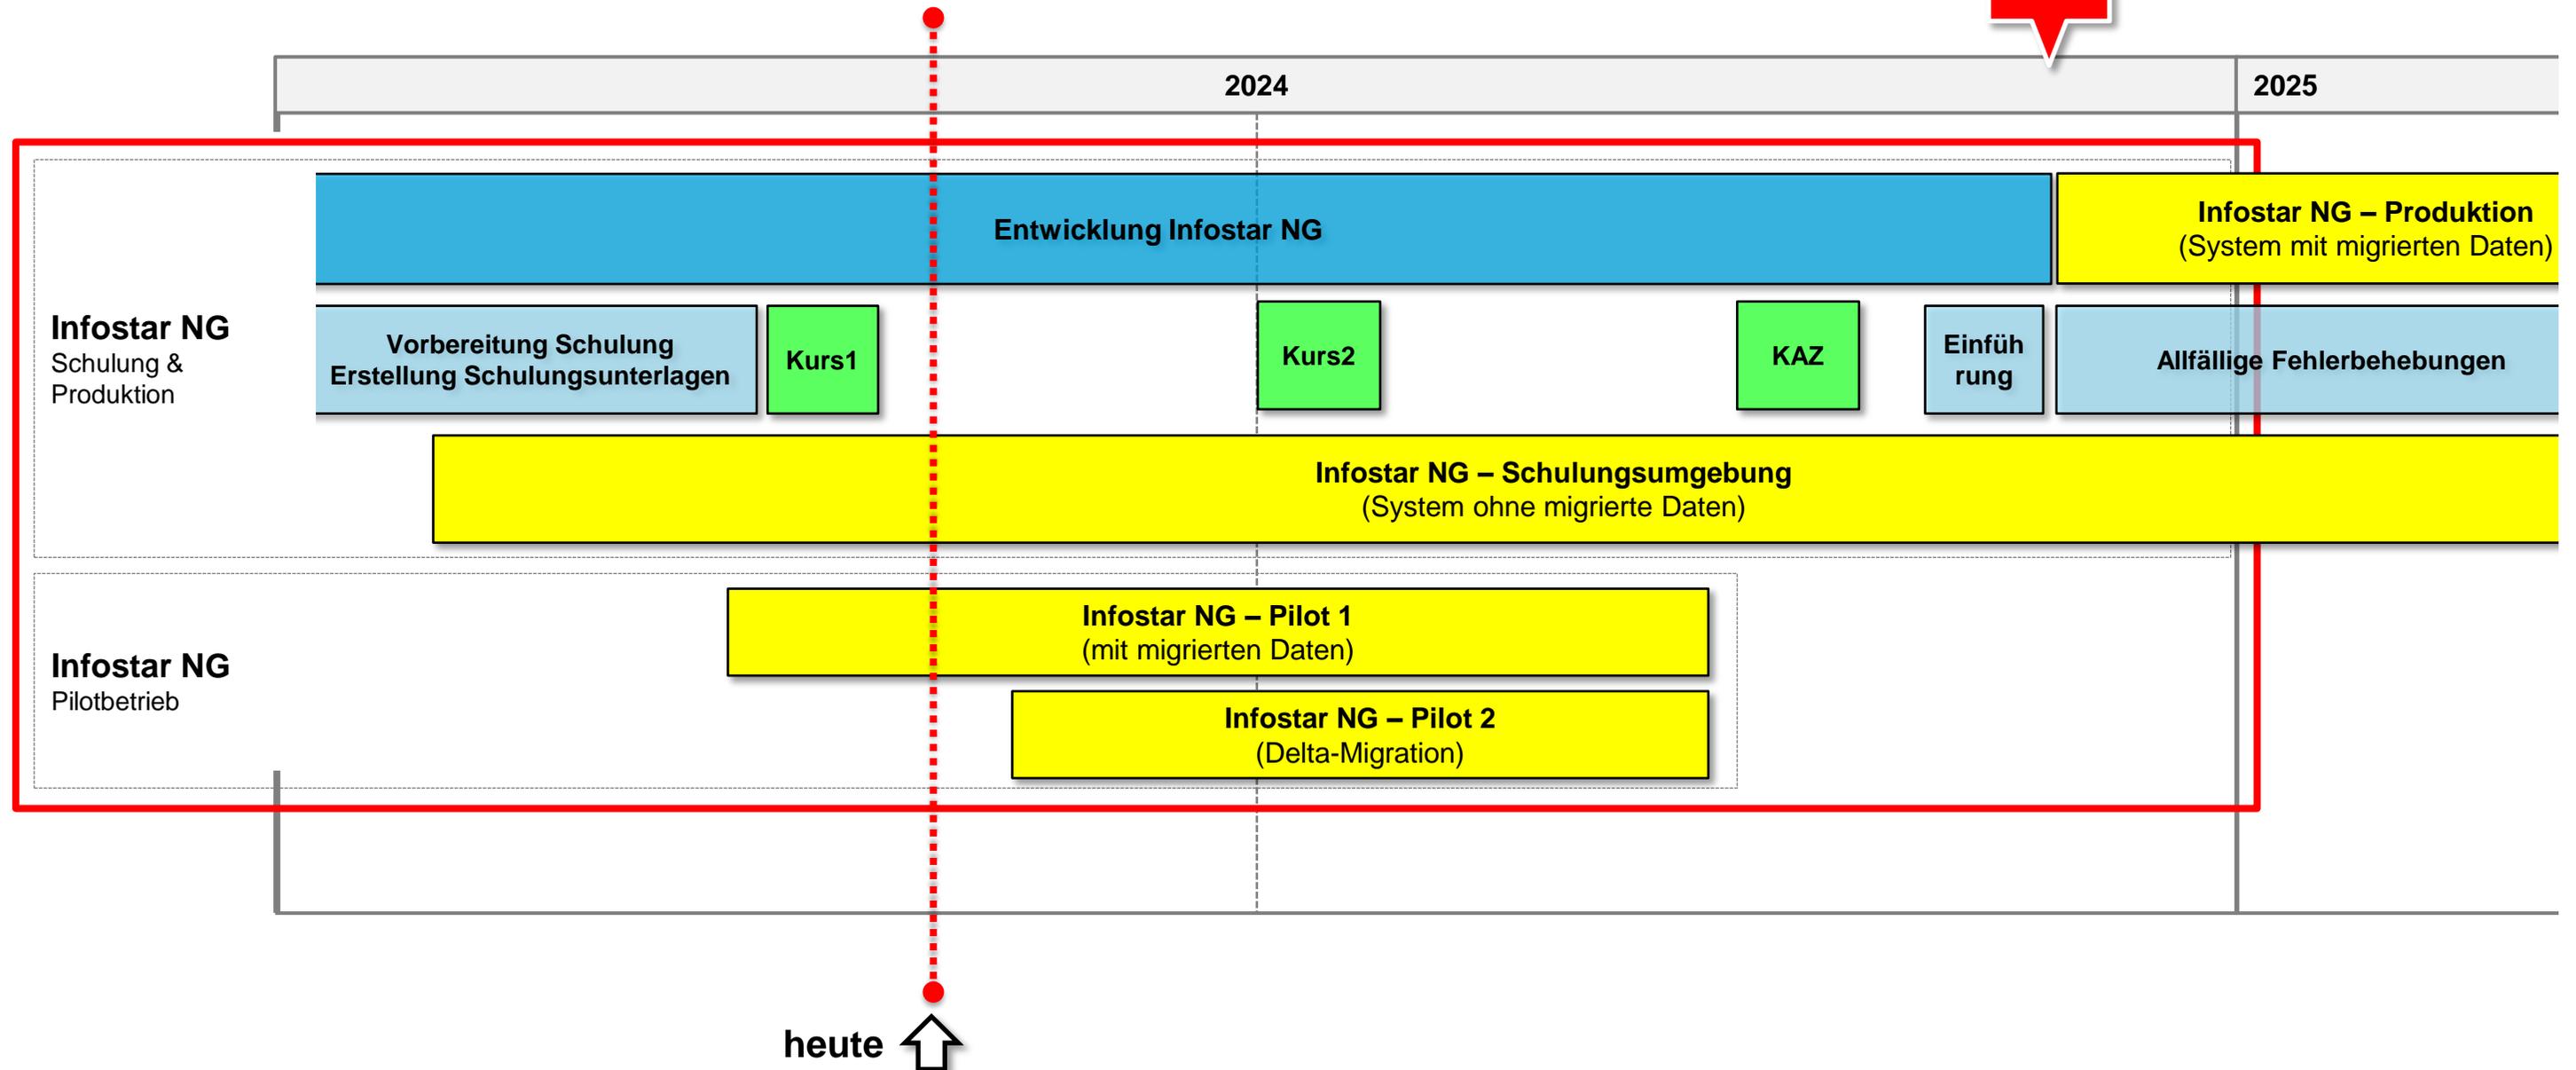


Personalsituation


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Justiz BJ
Direktionsbereich Privatrecht
Fachbereich Infostar FIS

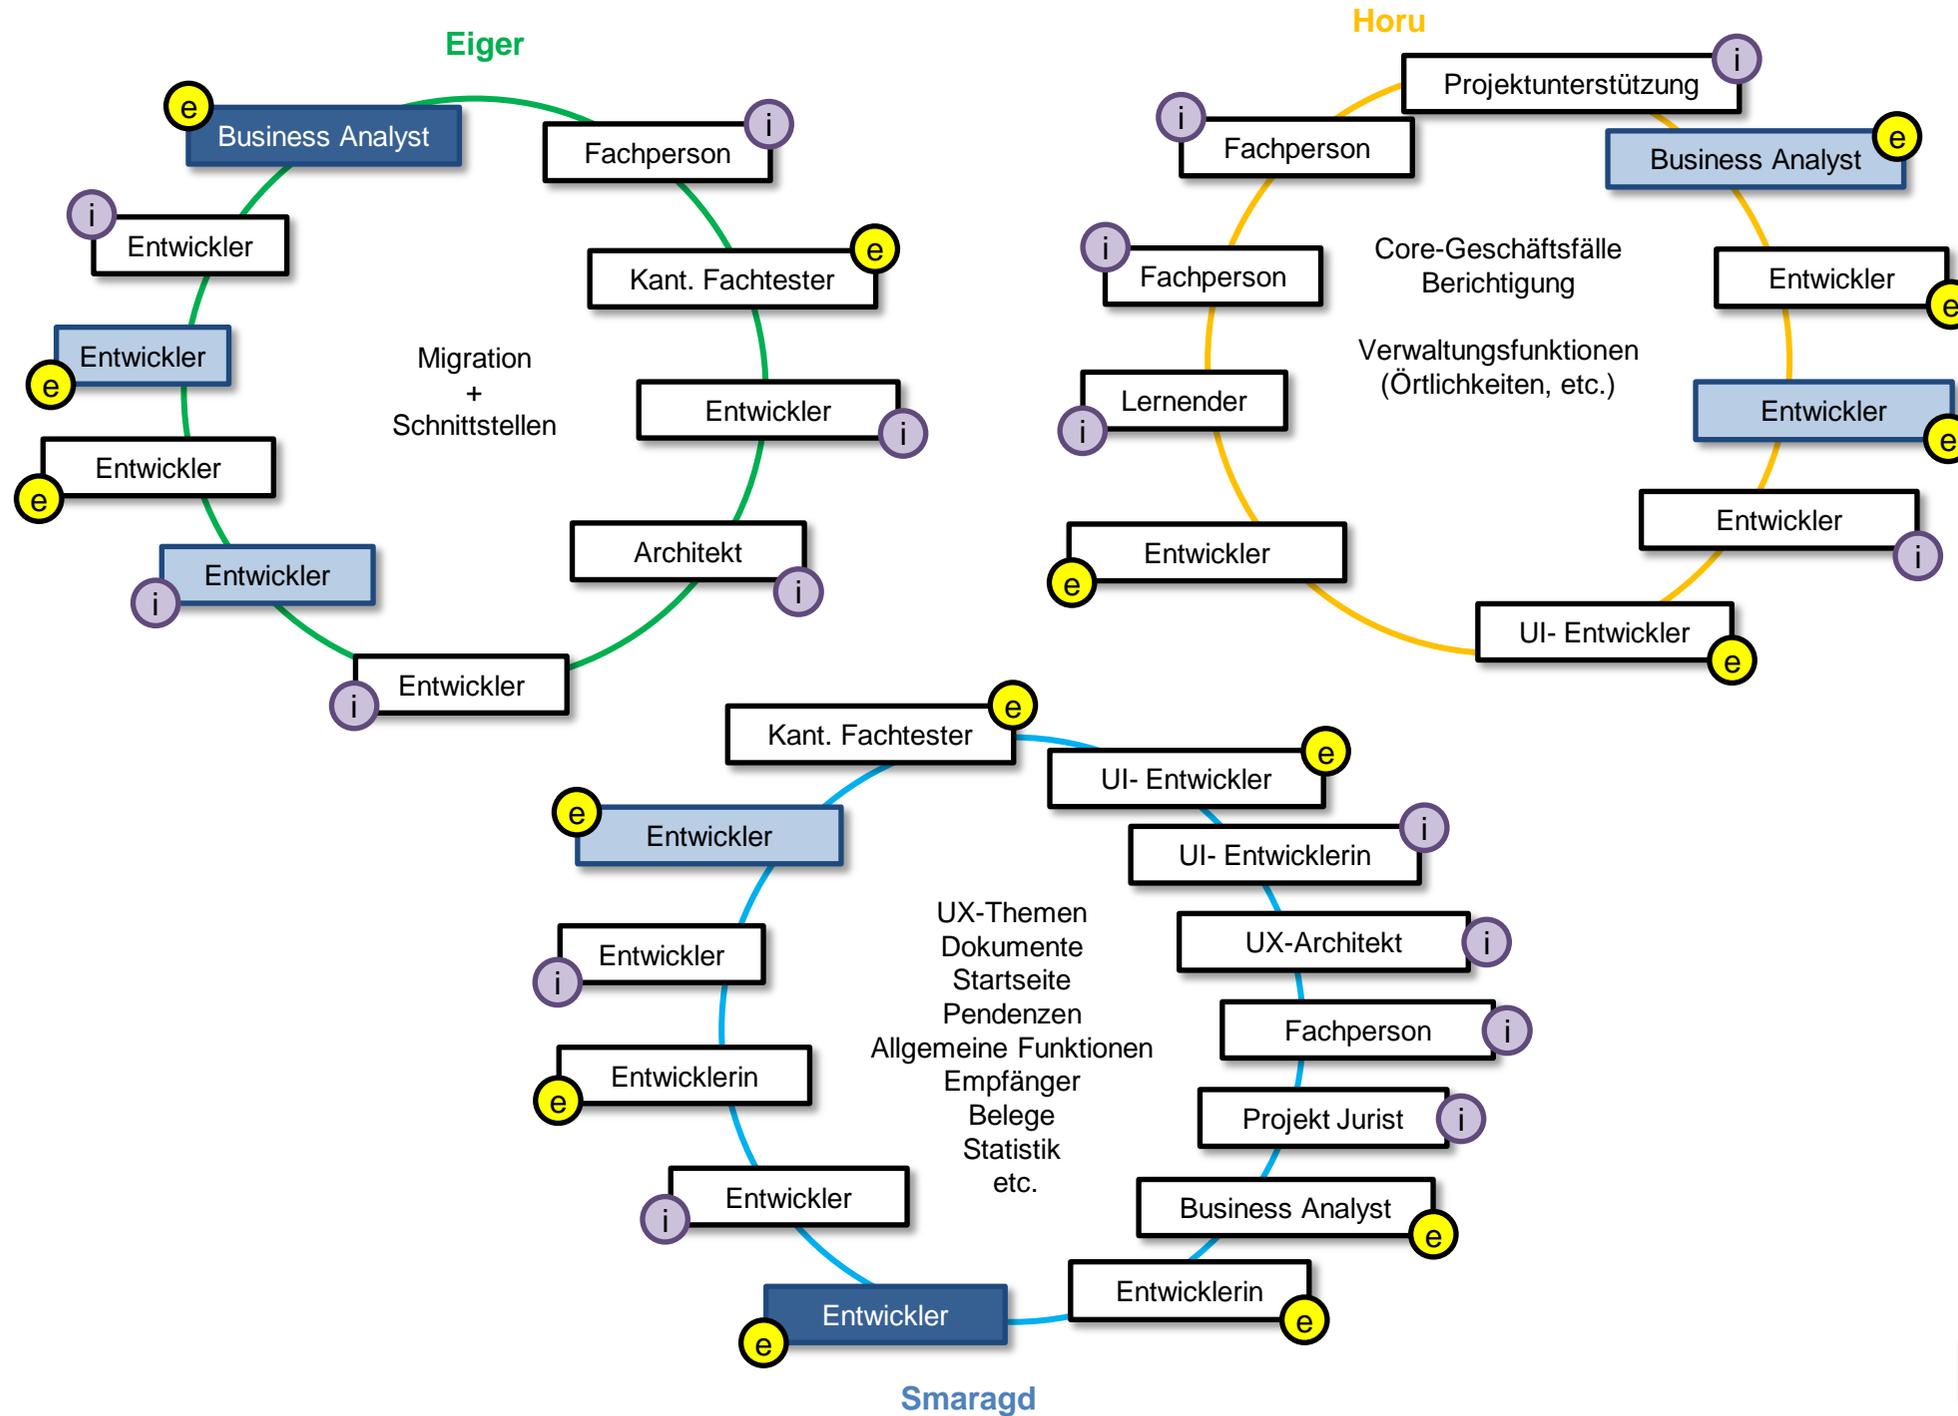

2 Projektmitarbeiter haben das Projekt per Ende 2023 verlassen
5 Projektmitarbeiter werden das Projekt per Mitte 2024 verlassen




i Interne
e Externe

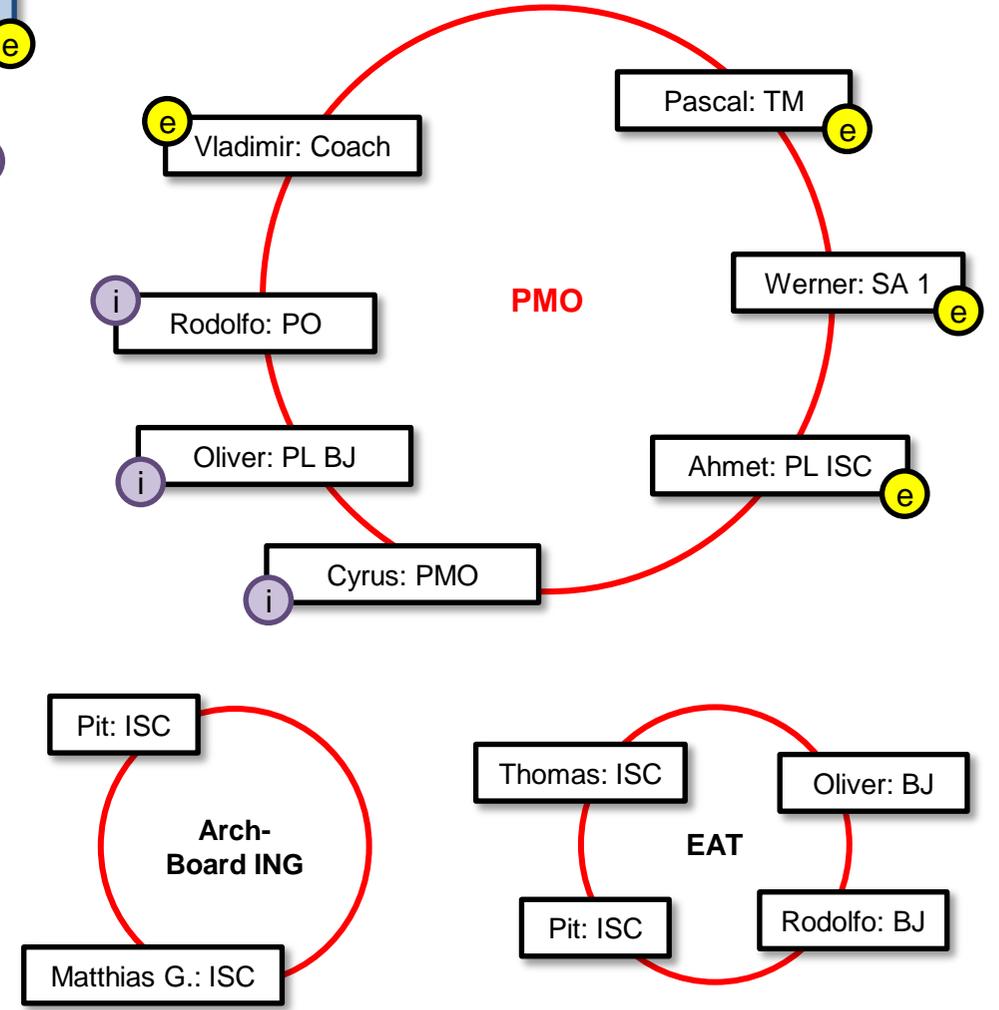



Legende

- i Intern
- e Extern

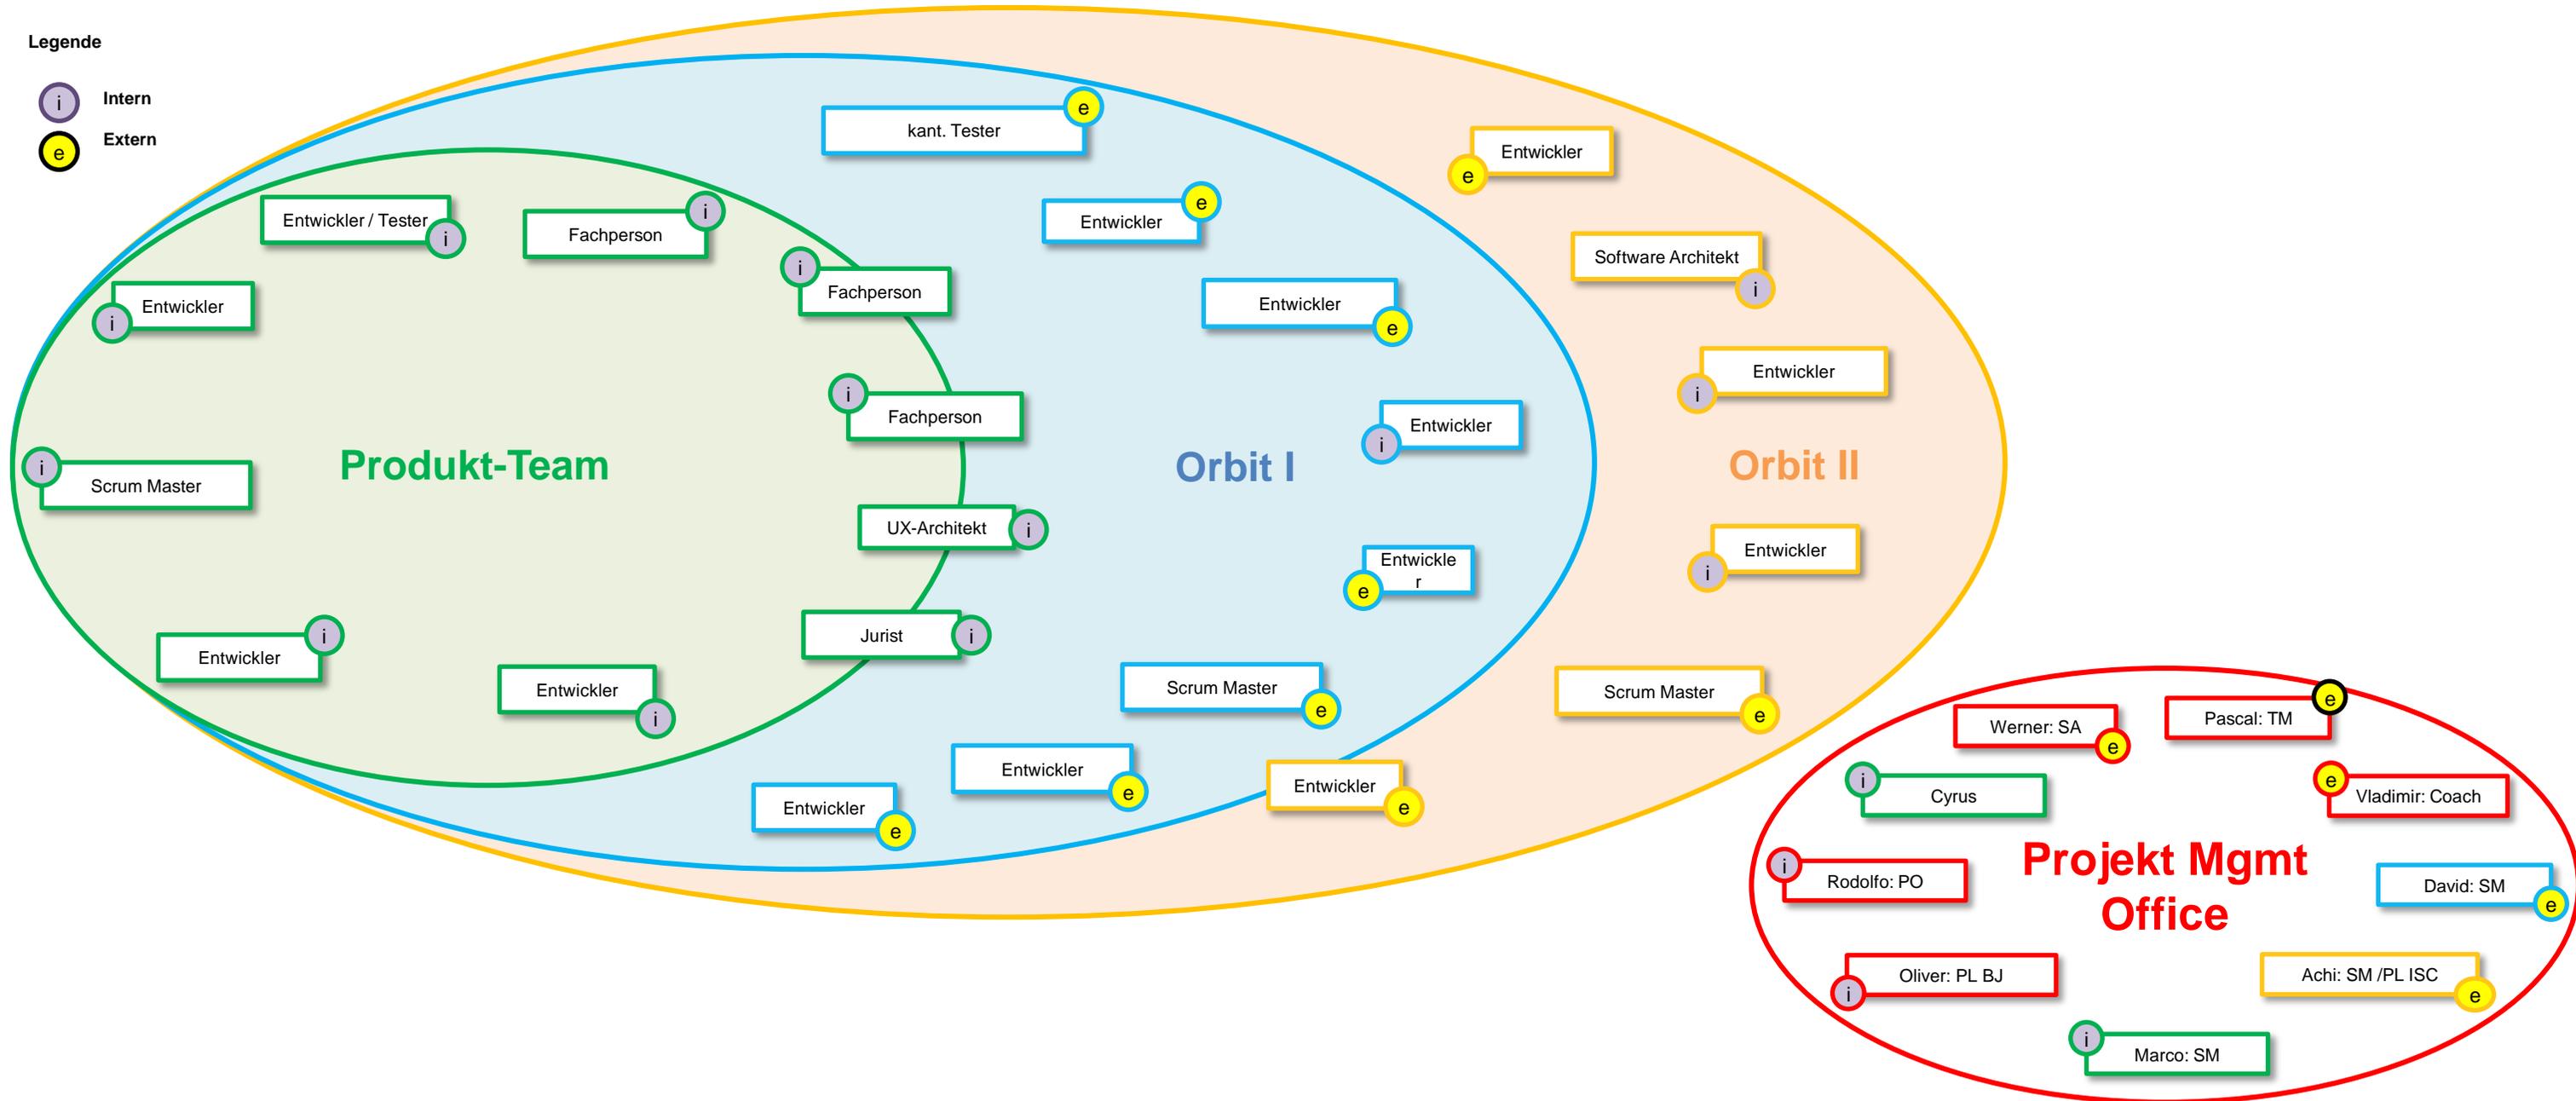

Legende

- Intern
- Extern

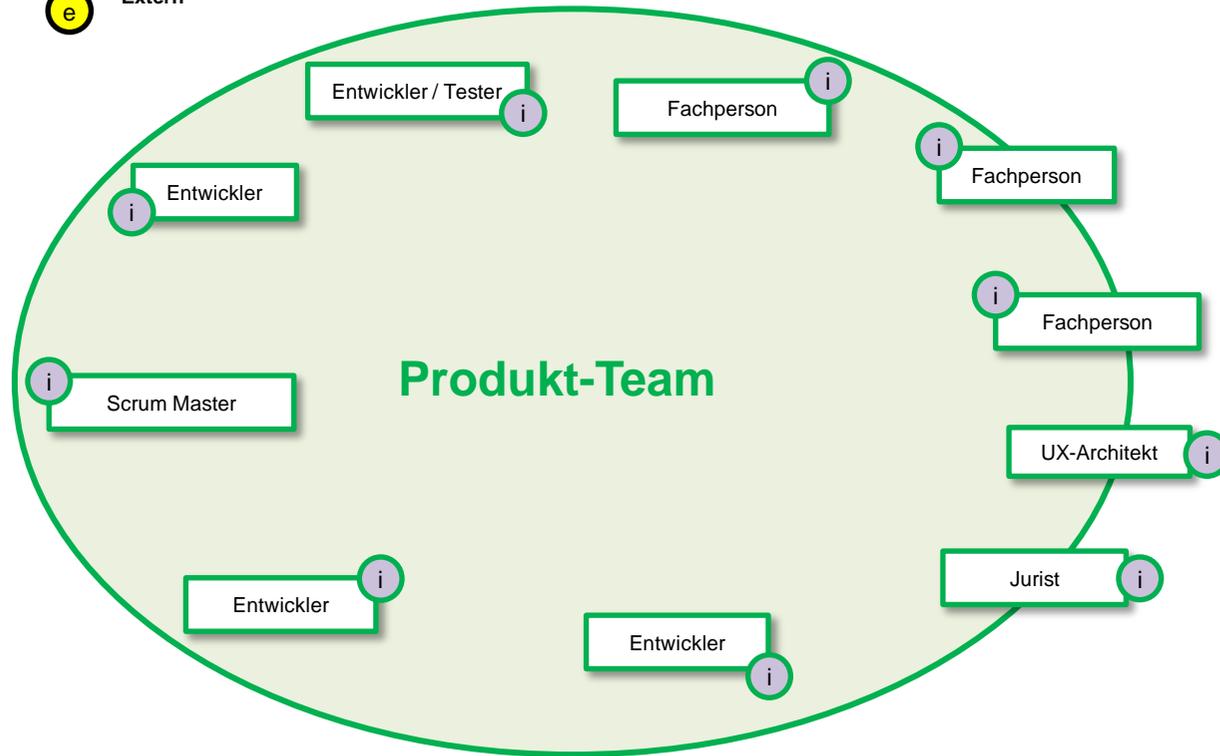



Stand der Umsetzung

Pendenzen

Belege

Sachbearbeiter Druckfunktion

Letzte Dokumente

Verwaltungsfunktionen

- Empfänger
- Bürgergemeinden und Mitteilungsempfang
- Default-Werte

Berichtigung

- Verwaltung / Antrag
- Grafische Übersicht / Listenübersicht
- Berichtigungssimulation
- Abschliessende Arbeiten

Zeichensatz-Tastatur

Migration aller Geschäftsfälle



Ausblick

Nächste grosse Meilensteine:

- **Berichtigung** finalisieren
- **Pendenzen** finalisieren
- **Belege** finalisieren
- **Startseite** inkl. Pendenzenverwaltung, News, Links, Amtssuche
- Weitere Optimierungen an der **Benutzerführung**
- Pilot-Testing und **Vorabnahme** mit Kantone
- **Schnittstellen-Testing** mit Partnern
- Einführungsarbeiten



Daten-Migration

Grosse Herausforderung bei der Qualität der Daten

Aktueller Stand

- Die **Erfolgsquote von ca. 99,994 %** wird **kontinuierlich verbessert**. Kein zusätzlicher Bearbeitungs-Aufwand für die Kantone und Gemeinden!
- **Inkrementelle Delta-Migration** funktioniert, unterdessen mit Berücksichtigung von **Berichtigungen, Löschungen, Korrekturen** etc.
- Die **Verkürzung der Migrationsdauer** wurde erfolgreich umgesetzt. **ca. 4.5 Tage** ist ein guter Wert und erlaubt flexibles Agieren und Reagieren.

Zahlen und Fakten

- Dauer der Migration: **4.5 Tage**, vorher ca. 19 Tage

Geschäftsfälle


- Anzahl Geschäftsfälle: > **18,8 Mio.**
- Erfolgsquote der Geschäftsfälle: ca. **99,994 %**
- Fehlgeschlagene Geschäftsfälle: ca. **2'012**

Personen

- Anzahl Personen: ca. **10,9 Mio.**
- Fehlgeschlagene Personen aktuell: **12**

Die Datenqualität wird durch die Daten-Migration nicht verändert!

Migration

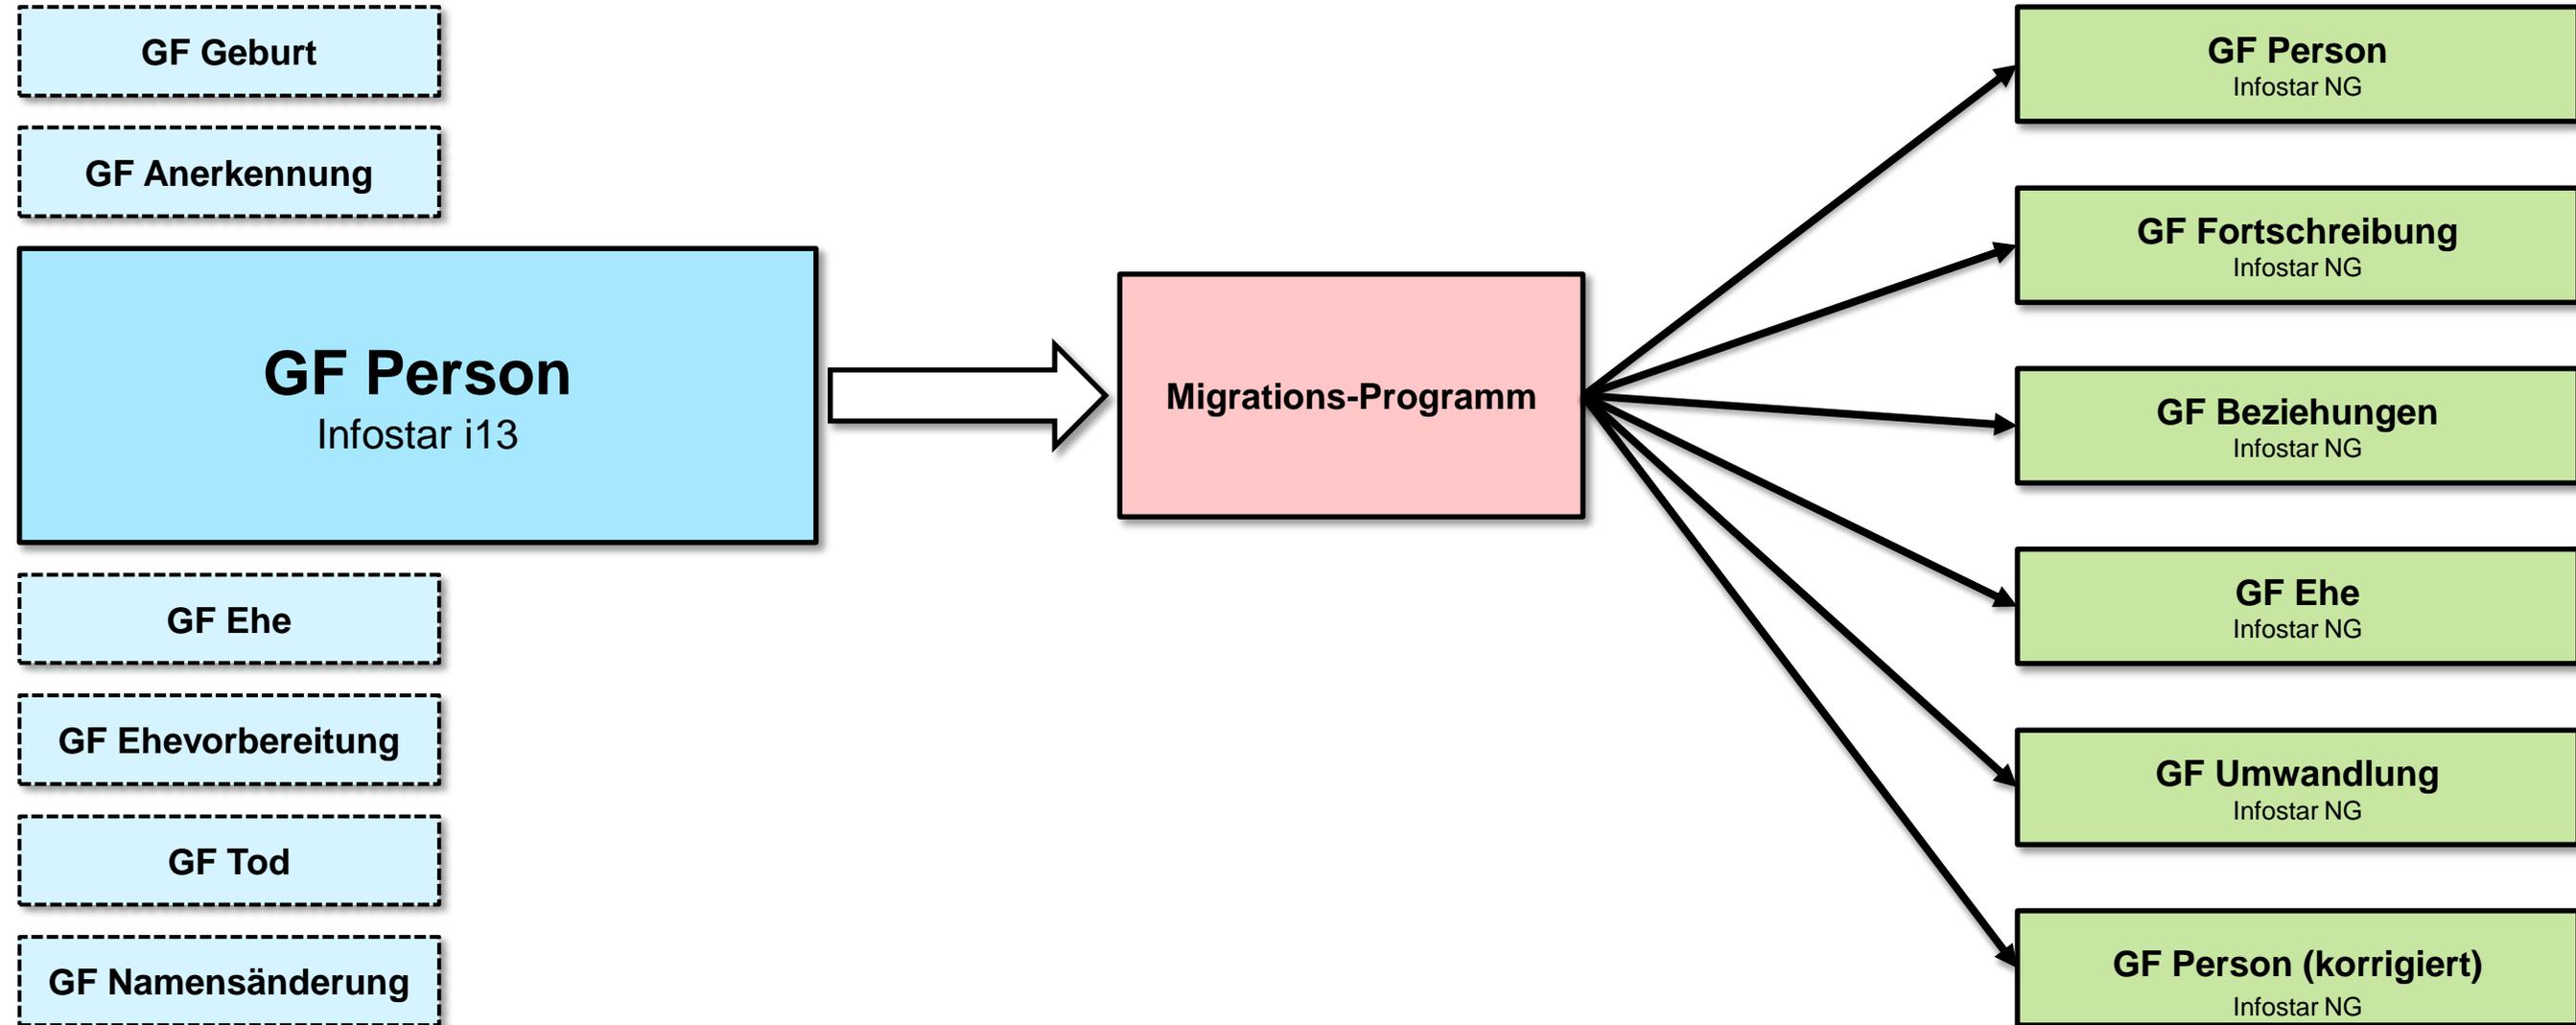



Pilotierung in den Kantonen

Pilotämter:

AB Bern

ZA Bern-Mittelland

ZA Ob- und Nidwalden

AB Zürich

ZA Zürich

ZA Olten- und Jura

ZA Nidwalden

AB Aargau

ZA Muri

ZA Meltingen

AB Graubünden

ZA Chur

AB Waadt

ZA Waadt

AB Ticino

ZA Bellinzona

ZA Lancy

Details:

Gestartet Ende April

- Es werden **zwei Pilot-Plattformen** aufgeschaltet.
Zuerst **Pilot 1** dann **Pilot 2** mit **Delta-Migrationsdaten**
- **Schulung für Aufsichtsbehörden** zum Thema **Berichtigung**, sobald die Funktion auf Pilot verfügbar sein wird
- Wiederkehrende **Koordinations-Meetings** online
- Fehler-Report via infostar-ng@bj.admin.ch

Schulung Berichtigung

Termine für die Schulungen des Berichtigungspersonal der **Aufsichtsbehörden**

Schulungen in Deutscher Sprache

AUG	SEP	SEP	SEP	SEP
28	04	11	13	18
MI	MI	MI	FR	MI

Schulungen in Französischer Sprache

AUG	SEP	SEP
30	05	12
FR	DO	DO



Ausblick auf Infostar NG 2 Themen

In Abstimmung mit der **Expertengruppe** sind hier die wichtigen Themen nach Priorität aufgelistet:

1. **Hybrid Dokumente** (Dokumente mit allen Daten aus Infostar die möglich sind, zur Vor-Bearbeitung vor dem Druck) als Ersatz der Notfalldokumente
 2. **Elektronisch signierte Urkunden** direkt aus Infostar
 3. **Flexible Statistiken** anhand von BI-Tools bzw. Datawarehouse
 4. **Scan to Pendenz** (Scannen von Dokumenten, Versand an spezielle E-Mail-Adresse, automatische Umwandlung in Pendenz mit PDF-Beleg)
 5. **Send to Pendenz** (Versand von signierten PDFs an spezielle E-Mail-Adresse, automatische Umwandlung in Pendenz mit PDF-Beleg)
 6. **Anbindung an weitere Systeme wie ZEMIS oder eVera**
 7. **Schnittstelle mit den CH-Auslandsvertretungen**
 8. **Schnittstelle mit den Spitälern**
- **Projekt-Studie im Gange. Erste Arbeiten starten noch im 2024**



Vorbereitungen in den Kantonen

Technische Vorbereitung

- Ergonomischer, grosser Bildschirm (besser zwei)
- Schnelle und stabile Netzwerkleitung bis zum SSO-Portal
- Aktueller Stand des Internet-Browsers (Edge, Firefox)
 - Internet Explorer wird nicht unterstützt
- Genügend Einzugsscanner zur Digitalisierung von Belegen (direkte Erstellung von PDF/A, mit OCR von Vorteil)
[nur wenn vor Ort im Amt gescannt werden soll]

Fachliche Vorbereitung

- Schulungsaufwand für 1st-Level-Supporter, Schulungsverantwortliche und Poweruser
- Schulungsaufwand für das Personal in den Zivilstandsämtern und Aufsichtsbehörden

Go-Live Datum und Vorgehen

Einführungsdatum

Mo 11.11.2024

Reservedatum

Mo 02.12.2024 oder **Mo 09.12.2024**



Freitag 08.11.2024

- Abschaltung Infostar 13 um 17.30 Uhr
- Inkrementelle Migration über Nacht

Samstag 09.11.2024

- Prüfung der Migration
- Finale Einstellungen
- Aufschaltung des Systems Infostar NG für die Pilotämter
- Beurkundung von Geschäftsfällen durch Pilotämter

Sonntag 10.11.2024

- Prüfungen und Tests der Produktionsplattform
- Freigabe und Aufschaltung des Systems Infostar NG für alle Kantone
- oder im Negativfall: Abbruch und zurück zu Infostar 13

Montag 11.11.2024

- **Arbeit in Infostar NG**
- im Negativfall: Arbeit in Infostar 13 / Beurkundung von Geschäftsfällen in I 13 durch Pilotämter



Demo des Systems

Umgesetzte Funktionen seit letzter Generalversammlung

Sebastian Leiggener

FIS Fachbereich Infostar, Zivilstandsbeamter

